

Rapporteren voortgang – 15 dec| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	- De BCO/coronamelder dag 5-studie is met vertraging van start gegaan. De juiste doelgroep op de juiste plek krijgen, gaat moeizaam. - Data van studies naar asymptomaten worden verzameld voor oordeel OMT 18 december - Studies naar nieuwe antigeentesten lopen, zodat er voor nieuwe inkoopronde genoeg data beschikbaar is.	- BCO/coronamelder studie is gestart in Brabant (14-12) en in Rotterdam (15-12). Aanloop valt tegen. Verpleeghuisstudie, eerstelijns spoedzorg studie & wijkstudie worden voortgezet - Validatie van nieuwe antigeentesten wordt voortgezet	- BCO/coronamelder, huisartsenspoedzorg, verpleeghuisstudie en huisartsenspoedzorg worden voortgezet. - Studies naar nieuwe antigeentesten worden voortgezet	●	●
Werkgroep LAMP	- Op dit moment is LAMP-uitrol in de opstartfase: - De eerst analysestraat is geplaatst op RAI en wordt getest - Definitieve LAMP-pakket is bepaald en wordt gevalideerd - Partijen maken afspraken over inkoop voor Amsterdam - Informatie is ingewonnen van TOMI (zie notitie)	- Opstartfase LAMP: bepalen definitieve pakket, oplossen kinderziektes en inkoop - Momenteel 200 samples per dag gedraaid met TT-robot in de validatieopstelling - Update implementatieplan LAMP	- Afronden opstartfase LAMP - Opschalen (als alles goed gaat) van samples op robot - Voorbereiden bredere uitrol van LAMP	●	●
Werkgroep STRIP	- STRIP pilot loopt. Robot 16 december beschikbaar voor validatiepilot fasen 2-4, eind januari productiepilot met GGD Brabant Zuidoost launch robot 1. - STRIP scale-up na nota Minister beslispunten 1) aantal robots en 2) aanbesteding in gang zetten via Dienst Testen.	- Robot 1 ingeregeld bij PAMM, SAT 16-12 - Nota minister met beslispunten scale-up - Cross contamination goeddeels opgelost - Bezoek 1 2) Toelichting Rijswijk	- Officiële inwerkingstelling op 21-12-2020 - Validatie door PAMM (RoI LCDK?) - Consumables scale-up zeker stellen - Opname STRIP in teststromen in gang zetten	●	●
Werkgroep Innovatieve testen (incl. Spironose)	- OMT heeft positief geadviseerd over het inzetten van de ademtest bij asymptomaten 5.1.2) Toelichting 5.1.2) Toelichting - Verkennde gesprekken worden gevoerd met verschillende innovatieve test-aanbieders	- Versnelde aanvraag CE-markering ademtest - Verkrijgen OMT-advies - Verkennde gesprekken met innovatieve testmethoden (EPD, ddPCR, gorgelkit, SpectraLIT)	- Verkrijgen CE-markering ademtest - Voorbereiden uitrol ademtest - Overzicht maken van innovatieve testmethoden - Implementatieplan SpiroNose	●	●
Werkgroep Thuis testen	- Instructievideo voor thuisafname is geschoten (14-12), montage 18-12 afgerond. - Studie naar kwalitatieve afname is gestart, bedoeling is dat onderzoek 20-12 wordt afgerond. Resultaten volgen een week later. - In gesprek met Schiphol over mogelijkheden experiment met overlap spoor 2-3.	- Validatie zelftesten wordt verder uitgewerkt. Opname instructievideo's wordt gepland - Kwalitatieve studie naar afname gaat van start - Link met spoor 2 gezocht voor mogelijkheden begeleide afname.	- Onderzoek naar kwalitatieve afname wordt afgerond, resultaten worden verwerkt. - Met Schiphol in gesprek over mogelijkheden experiment spoor 2/3 overlap. - Onderzoek naar thuis testen: met GGD Hart voor Brabant in overleg over startdatum, instructievideo wordt gemaakt.	●	●

Rapporteren voortgang – 15 dec | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie	- Deze week locaties Ahoy, Limburg, Friesland en Zeeland open. - Twee locaties waarvan de opening naar begin januari 2021 is verschoven (Twente en Drenthe). In de laatste week van december nog 2 locaties die open gaan (Vijfhuizen, Arnhem/Nijmegen) - Toolkit / Blauwdruk is gereed. - Focus op overdracht van de centrale organisatie naar de projectorganisatie van GGDGHOR	- Afronden Toolkit antieenproces voor GGD fase 2 - Voorleggen toolkit aan de IGI - Start met afbouwen van Operatie Fastlane in Spoor 1. Bezig met overdracht van contracten, concepten naar GGDGHOR. Bijdrage aan spoor 1 eindigt eind 2020. - Doorstart van Operatie Fastlane naar spoor 2	Overdracht centrale organisatie naar GGDGHOR	●	●
Informatie en prognose	- Eerste keer tijdige aanlevering van alle data - Geen voortgang op aansluiting bronnen, doorlooptijden en cijfers antieen - Geen toegang tot extra informatie over o.a. BCO/coronamelder	- Eerste informatie spoor 2 toegevoegd - Discussie rondom inzicht beleid BCO/coronamelder	- Datatoegang coronIT, doorlooptijden en afnames antieen nog steeds niet betrouwbaar - Werken aan definitie afnames klinische stroom	●	●
Communicatie	- Communicatie rond verbreding testdoelgroepen (1/12) lopend - Communicatie proefprojecten na kick off: communicatie als instrument voor deelnamebevordering - Mijlpalen - communicatie aangepast op nieuwe plannings	- Proefprojecten: Kick off Rotterdam voorbereid - Social media: aandacht voor testbereidheid en sneltesten - Campagne: extra uitingen testbereidheid (radio en online)	- Voorbereiding start testrobot STRIP Veldhoven (gepland 21-12) - Laatste fase uitrol XL straten - Communicatieoverleg proefproject Urk - Communicatieaanpak spoor 2 uitwerken - Start campagne testbereidheid	●	●

Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen Martiniplaza	Indoor	09-nov	800	2469		Geen bijzonderheden, locatie volledig overgedragen aan regionale GGD. Supervisors vanuit landelijk nu vervangen voor lokale coördinatoren. Sollicitatie procedure loopt.	
Amsterdam Zuidoost / Diemen	Paviljoen L	LAMP 14-dec	AL in GGD roadmap	2520		Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers. Aangezien de implementatie van de LAMP test in de RAI is uitgesteld, heeft dat ook effect op de implementatie voor Zuidoost.	- Planning is om in week 2 te starten met LAMP - Verzamelen swaps in Zuidoost t.b.v. validatie massa spectrometer (in Leiden)
Amsterdam RAI	Indoor	LAMP 7-dec	AL in GGD roadmap	5040		Nieuwe pipeteer robot in de Rai – resultaten worden verwacht	
Amsterdam Sloterdijk	Paviljoen XL	LAMP 18-jan	AL in GGD roadmap	2520		Scouten van locatie. Locatie voorgelegd, besluit volgt donderdag	- Akkoord stuurgroep en stadsdeel ophalen - Vergunningverlening + verkeerplan opstarten - Draaiboek maken
Amsterdam Noord	Paviljoen L	LAMP: 16 dec	AL in GGD roadmap	2520		Donderdag 10 December testcentrum operationeel. Was opstartprobleem met CoronIT is opgelost. 8 straten omgebouwd naar e-nose (oefenomgeving) Ontheffing verleend onder voorwaarde brandwacht – brandweer was niet akkoord (haspels etc.).	- Wachten op OMT advies m.b.t. e-nose - wachten op CE keurmerk/ ontheffing e-nose apparatuur - Mogelijk oefenen met e-nose/ operationaliseren
Schiphol	Paviljoen XL	01-dec	1.100	2899		Projectleider 5.1.2e heeft het project van 5.1.2e overgenomen. Alternatief voor warmteprobleem geïnstalleerd. Van project naar beheerorganisatie.	- Draaiboek optimaliseren - Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren - Vragen over overdracht en contracten
Expo Vijfhuizen	Indoor	21-dec	AL in GGD roadmap	2500		1000- 1100 PCR per dag. In andere hal van Expo antigeen inrichten (2 straten) open op 21 december. Hal tot 28 februari beschikbaar	Locatie inrichten
Jaarbeurs Utrecht	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Paviljoen draait met PCR en twee labs voor Antigeen. Probleem is wel dat XL alleen voor inwoners van stad Utrecht als optie op coronatest.nl omhoog komt. Hierdoor onderbenutting van capaciteit en hoge druk op de decentrale locaties in de regio.	- Contract regio lab (VWS/LCDK moeten nog komen met format en wijze van financiering) - Blijvend aandacht vragen voor problemen coronatest.nl
Broodfabriek Rijswijk	Indoor	11-nov	600	2400		Locatie is open en draait. Nog steeds veel gele en rode stippen op XL-locatie (o.a. zorgpersoneel en kwetsbare groepen)	- Overgaan op PCR vanaf week 21/12 op de XL-locatie 5.1.2i Toelichting
RTH Airport	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 30-11-2020	2600	7578		RTHA is 23 november open voor PCR en voor Antigeen op 30 november. Het tweede lab wordt voor de kerst geleverd en in eerste week van januari ingericht voor	- Leren & verbeteren - Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten - Inrichten 2e laboratorium (lab wordt 21 december

Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Ahoy Rotterdam	Paviljoen XL	15-dec	1400	4245		14 december opening locatie Ahoy voor zowel PCR als Antigeen. Het tweede lab wordt deze week geïnstalleerd en zal vanaf volgende week in gebruik worden genomen.	- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten - Inrichten 2e lab
Anton Coolenlaan Eindhoven	Outdoor	01-dec	1100	3196		Locatie is open. XL-locatie nog onvoldoende te zien in CoronIT. Antigeen proces nog niet op niveau standaard van GGD. Nog issue over personeel.	- Oplossing CoronIT - Overdracht: issues personeel en antigeenproces - Vragen over luchtkwaliteit op locatie
P&R Lent Arnhem / Nijmegen	Paviljoen L	21-dec	1100	3309		GGD Gelderland-Zuid heeft de leiding voor het project op zich genomen. Paviljoen is in facilitair opzicht klaar. Komende week: instructie Defensie en personeel. Zo spoedig als mogelijk richting opening.	- Lab koppelen aan analyse ruimte van locatie - Introductie Defensie - Trainingen Personeel - Dry-run - Bepalen definitieve openingsdatum
IJsselhallen Zwolle	Indoor	04-dec	600	1855		Locatie draait goed, we schalen op volgens afspraak. Deze week hopelijk uitwerkingen bij medische en lab verantwoordelijkheid. Personeel geworven en ingewerkt.	- Afspraak LCDK, LMMI, GGD - Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD - Werven en onboarden gaat door
MECC Zuid Limburg	Outdoor	15-dec	900	2673		Opening op 15 december. Maandag 14 december heeft laatste dryrun plaatsgevonden in aanwezigheid van enkele collega's vanuit fastlane en heeft het personeel geoefend met de testverwerking	Bijstellen op basis van eerste ervaringen
Campus UI Twente	Outdoor	06-jan	600	1864		Locatie: plattegrond, concept beoordeling. Besluit gebruik antigeentest SD Biosensor	- Plattegrond locatie: afronding tbv vergunning - Plattegrond locatie: nadere bespreking inrichting - Fastlane: afspraken mbt ondersteuning - Nadere afstemming laboratorium / antigeenproces - Procesbeschrijvingen maken/aanpassen
Bergen op Zoom West Brabant	Outdoor	04-jan	900	3379		Locatie gevonden. Uitrol om begin januari te starten. Combi van avond en locatie Bergen op Zoom	Tekeningen afronden en start met bouwen
WTC Saxenhal Friesland	Indoor	15-dec	425	1275		Werkprocessen aangepast, personeel opgeleid. Dry-run is goed verlopen (14/12). Opening op 15/12 met antigeen en PCR.	Finetunen processen
TT Circuit Assen Drenthe	Paviljoen L	04-jan	275	824		Forse bijstelling planning (2 weken vertraging) door vertraging bouw.	- Besluit over definitieve tekening (uiterlijk 17-12) - Detailproductie (vanaf 18-12) en offerte - Besluit offerte (uiterlijk 23-12) - Start bouw (uiterlijk 28-12)
Zeelandhallen Goes	Indoor	15-dec	324	971		De locatie is 14/12 open gegaan voor PCR. De Liaison wordt gevalideerd door het ADRZ	28 december starten met antigeentesten



Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 51


2. Paviljoen Zuidoost/Diemen

Projectleider: 5.1.2e


Testlocatie

- Concept Amsterdams Paviljoen (L) reeds aanwezig
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 44	1.200
Antigeen		
LAMP	Wk 2	1.000
5.1.2i Toelichting		

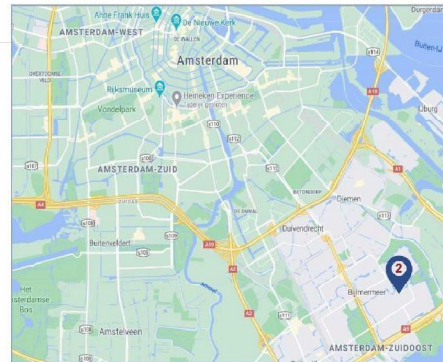

Aantal testen verwacht vs. actueel

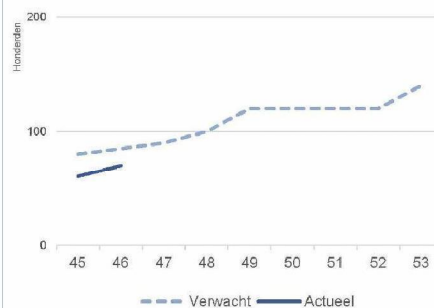

Activiteiten afgelopen week

- Verzamelen swaps in Zuidoost t.b.v. validatie massa spectrometer (in Leiden)

Activiteiten komende week

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status L-locatie Zuidoost

Toelichting op status algemeen:

5.1.2i Toelichting

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

3. Amsterdam RAI

Projectleider:


5.1.2e




Testlocatie

- Aansluiten bij de bestaande teststraat GGD
- Hal 1 is beschikbaar
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 45	3.600
Antigeen		
LAMP	Wk 53	1.000
	Wk 1	2.500
5.1.2i Toelichting		

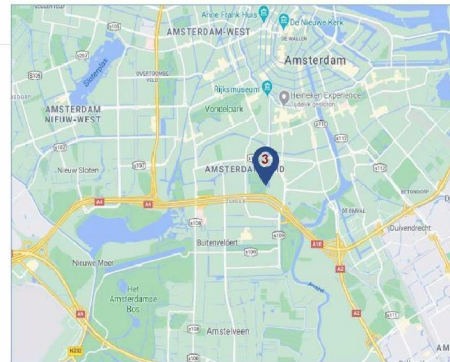

Aantal testen verwacht vs. actueel

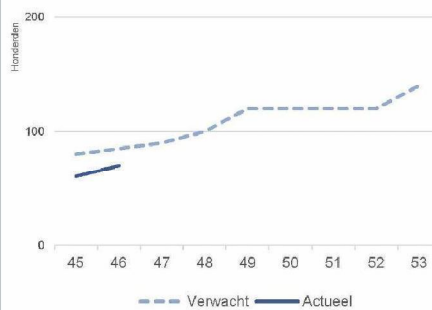

Activiteiten afgelopen week

1. Nieuwe pipeteer robot in de Rai – resultaten worden verwacht

Activiteiten komende week

- 1.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie RAI

Toelichting op status algemeen:

5.1.2i Toelichting

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

4. Paviljoen Sloterdijk


Projectleider: 5.1.2e



Testlocatie

- Concept Amsterdams Paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP	Wk 5	3.000
	Wk 6	3.500
5.1.2i Toelichting		

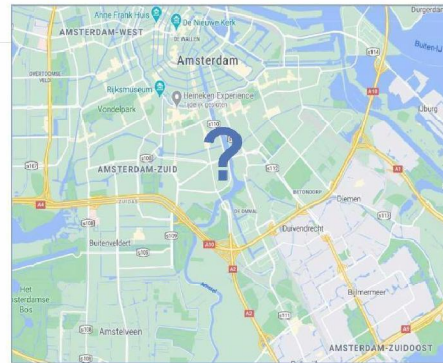


Status XL-locatie Sloterdijk

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

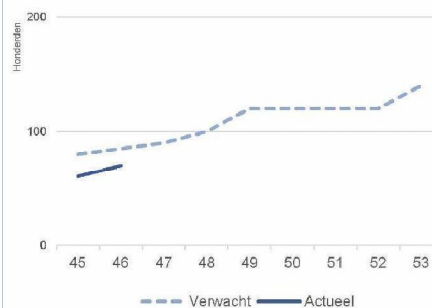

Activiteiten afgelopen week

1. Locaties scouten

Activiteiten komende week

1. Akkoord stuurgroep en stadsdeel ophalen
2. Vergunningverlening + verkeerplan opstarten
3. Draaiboek maken

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig


6. Luchthaven Schiphol

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- P4
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08.00 – 18.00 uur (eerste twee dagen: 10.00 – 17.00 uur)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	1 dec.	1.000
Antigeen	1 dec.	1.000
LAMP	N.n.b.	N.n.b.
5.1.2i Toelichting		

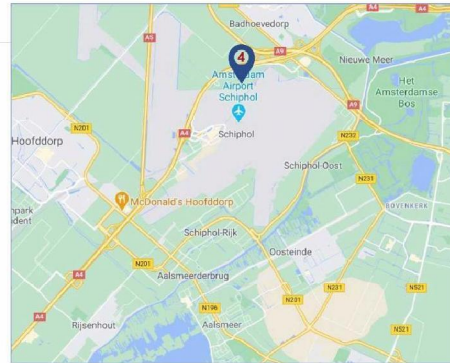


Status XL-locatie Schiphol

Toelichting op status algemeen:

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

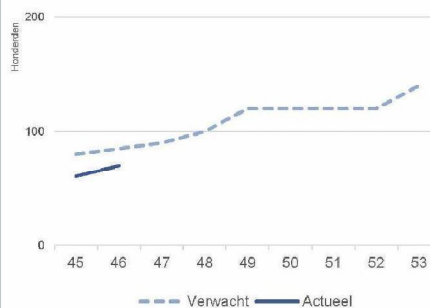

Activiteiten afgelopen week

1. BHV cursus dagcoördinatoren
2. Alternatief voor warmteprobleem geïnstalleerd
3. Projectleider 5.1.2e heeft het project van 5.1.2e overgenomen

Activiteiten komende week

1. Draaiboek optimaliseren
2. Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

7. RTHA


Datum: 14 december 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e


Testlocatie

- Parkeerterrein
- Concept: paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	~ 23 nov	~1.000 – 2.600
Antigeen	~ 30 nov	~1.000 – n.t.b.
LAMP	Dec	N.t.b.
5.1.2i Toelichting		

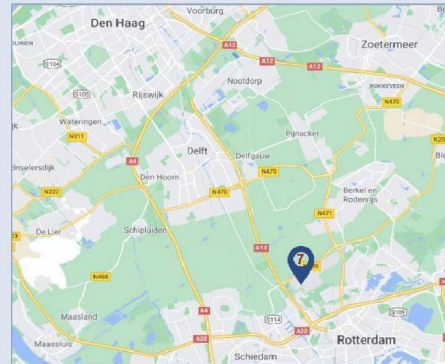

Aantal testen verwacht vs. actueel

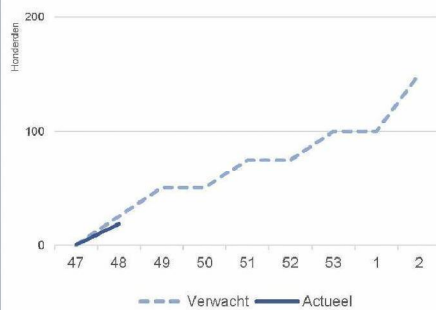

Activiteiten afgelopen week

- Opening paviljoen voor PCR & Antigeen
- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten

Activiteiten komende week

- Leren & verbeteren
- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
- Inrichten 2^e laboratorium (lab wordt 21 december geleverd, nog bepalen waar deze wordt geplaatst)

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie RTH Airport

RTHA is 23 november open voor PCR en voor Antigeen op 30 november. Het tweede lab wordt voor de kerst geleverd en in eerste week van januari ingericht voor gebruik.

✓ Onderwerp	PCR/LAMP	Antigeen
Contact met DPG	●	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●	●
Vergunningen en contracten	●	●
Materieel en inrichting	●	●
Personeel	●	●
Opleiding	●	●
Koppeling CoronIT	●	●
Infrastructuur	●	●
Apparatuur	●	●
Afnamemateriaal	●	●
Reagentia / testen	●	●
PBM	●	●
Verkeersstromen	●	●
Labs op locatie	●	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantw.	●	●
Procesbeschrijvingen	●	●
Capaciteitsplanning en forecast	●	●
Waarborging privacy	●	●

8. Ahoy Rotterdam

Datum: 14 december 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e


Testlocatie

- Ahoy Parkeerterrein
- Concept: Paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

Test	Vanaf	# testen / dag
PCR	n.t.b.	~ 1.000 – 2.600
Antigeen	n.t.b.	~ 1.000 – 4.200
LAMP	Dec	N.t.b.
5.1.2i Toelichting		



Aantal testen verwacht vs. actueel

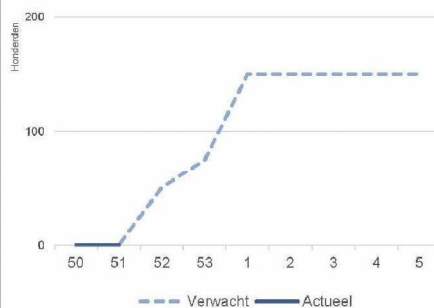

Activiteiten afgelopen week

- Start bouw woensdag 25 november
- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
- Inrichten 1^o lab
- Oefenen / proefdraaien

Activiteiten komende week

- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
- Inrichten 2^o lab

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Ahoy

14 december opening locatie Ahoy voor zowel PCR als Antigeen. Het tweede lab wordt deze week geïnstalleerd en zal vanaf volgende week ingebruik worden genomen.

✓ Onderwerp	PCR/LAMP	Antigeen
Contact met DPG	●	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●	●
Vergunningen en contracten	●	●
Materieel en inrichting	●	●
Personeel	●	●
Opleiding	●	●
Koppeling CoronIT	●	●
Infrastructuur	●	●
Apparatuur	●	●
Afnamemateriaal	●	●
Reagentia / testen	●	●
PBM	●	●
Verkeersstromen	●	●
Labs op locatie	●	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantw.	●	●
Procesbeschrijvingen	●	●
Capaciteitsplanning en forecast	●	●
Waarborging privacy	●	●


5. Paviljoen Noord

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Concept Amsterdams Paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 51	1000
	Wk 52	1500
Antigeen		
5.1.2i Toelichting		




Status XL-locatie Noord

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

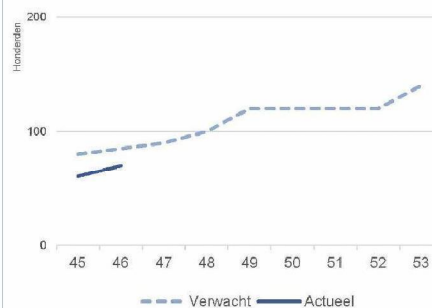

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

- Donderdag 10 December testcentrum operationeel
- 8 straten omgebouwd naar e-nose (oefenomgeving)
- Ontheffing verleend onder voorwaarde brandwacht – brandweer was niet akkoord (haspels etc.)

Activiteiten komende week

- Wachten op OMI advise m.b.t. e-nose
- wachten op CE keurmerk/ ontheffing e-nose apparatuur
- Mogelijk oefenen met e-nose/ operationaliseren

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

8. Jaarbeurs Utrecht


Projectleider: 5.1.2a

Testlocatie

- Parkeerterrein P2 van de Jaarbeurs
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: start 9:00-17:00 (doorgroei 8:00-21:00)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	13 nov	#1300
Antigeen	23 nov	#4000

5.1.2i Toelichting

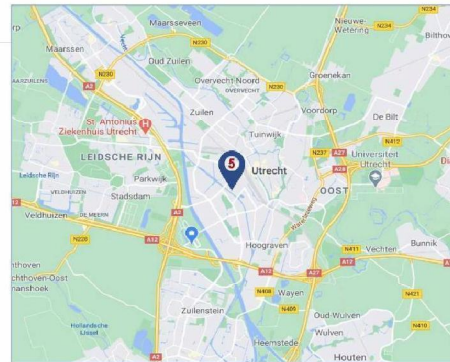


Status XL-locatie Jaarbeurs

Paviljoen draait met PCR en twee labs voor Antigeen. Probleem is wel dat XL alleen voor inwoners van stad Utrecht als optie op coronatest.nl omhoog komt. Hierdoor onderbenutting van capaciteit en hoge druk op de decentrale locaties in de regio.

✓ Onderwerp	Progress
✓ Contact met DPG	●
✓ Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
✓ Materieel en inrichting	●
✓ Personeel	●
✓ Opleiding	●
✓ Koppeling CoronIT	●
✓ Infrastructuur	●
✓ Apparatuur	●
✓ Afnamemateriaal	●
✓ Reagentia / testen	●
✓ PBM	●
✓ Verkeersstromen	●
✓ Labs op locatie	●
✓ Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
✓ Procesbeschrijvingen	●
✓ Capaciteitsplanning en forecast	●
✓ Waarborging privacy	●

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

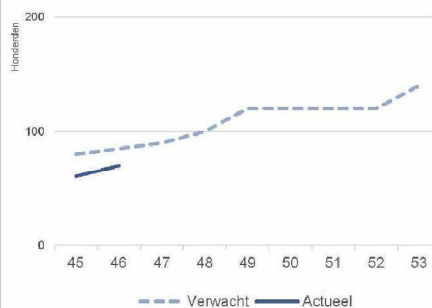

Activiteiten afgelopen week

1. Draait regulier
2. Audit bemonstering en lab
3. Meer triage aan de poort ivm feit dat coronatest.nl en landelijk callcenter geen optie geeft voor PCR vleugel
4. Analyse waarom Coronatest.nl nog niet goed voor bedieningsgebied

Activiteiten komende week

1. Contract regio lab (VWS/LCDK moeten nog komen met format en wijze van financiering)
2. Blijvend aandacht vragen voor problemen coronatest.nl

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig



17. Drenthe

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie: TT Circuit Assen
- Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Begin jan.	nog onbekend
Antigeen	Begin jan.	280 (van 507)
5.1.2i Toelichting		

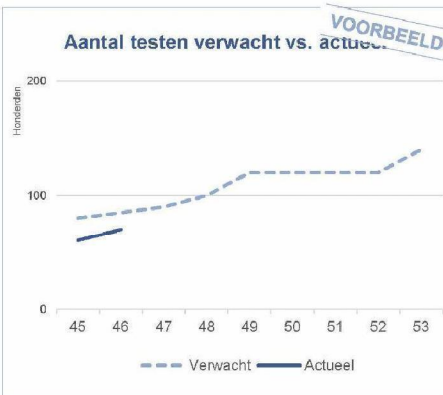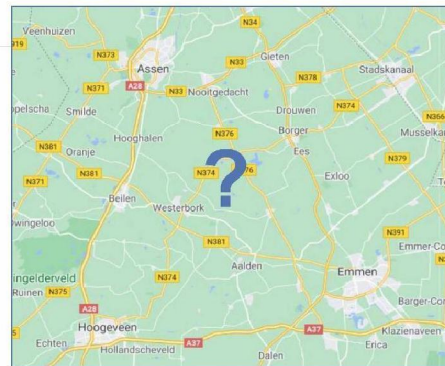

Activiteiten afgelopen week

- Procesbeschrijvingen verhelderen
- Personeel/opleidingsplan
- Definitieve inrichting teststraat
- Inrichting lab verhelderen

Activiteiten komende week

- Besluit over definitieve tekening (uiterlijk 17-12)
- Detailproductie (vanaf 19-12) en offerte
- Besluit offerte (uiterlijk 23-12)
- Start bouw (uiterlijk 28-12)

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Drenthe

Toelichting op status algemeen: Forse bijstelling planning (2 weken vertraging) door

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	●
✓	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding personeel	●
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	○
	PBM	●
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	○

13. Arnhem / Nijmegen

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie


- Locatie gekozen
- Volgens concept Amsterdam Z-O paviljoen (L)

Test	vanaf	# testen / dag
------	-------	----------------

PCR

Antigeen

5.1.2i Toelichting

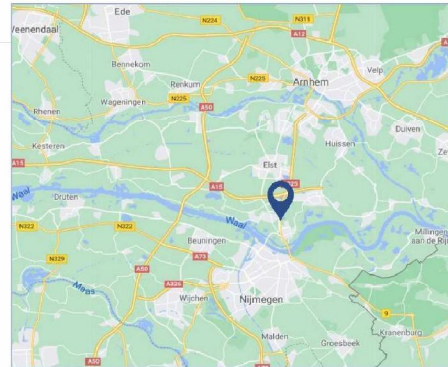

Activiteiten afgelopen week

- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN (Stuurgroep)
- Verantwoordelijkheden projectteam duidelijk
- Opdrachtverstrekking personele invulling Randstad/Defensie
- Afstemming GGD Inkoop, ICT, Medische Supervisie
- Finale inrichting teststraten en lab. (Trilat)

Activiteiten komende week


- Lab koppelen aan analyse ruimte van locatie
- Introductie Defensie
- Trainingen Personeel
- Dry-run
- Bepalen openingsdatum

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Arnhem/Nijmegen

Toelichting op status algemeen: GGD Gelderland-Zuid heeft de leiding voor het project op zich genomen. Paviljoen is in facilitair opzicht klaar. Komende week: instructie Defensie en personeel. Zo spoedig als mogelijk richting opening.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

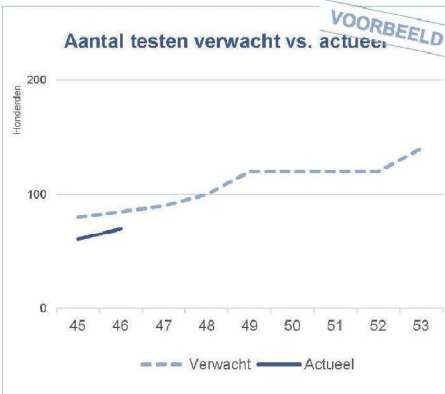

14. IJsselland

Datum: 14-12-2020



Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie: De IJsselhallen
- Openingstijden: 8-21 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		600
Antigeen		1885
5.1.2i Toelichting		

Aantal testen verwacht vs. actueel

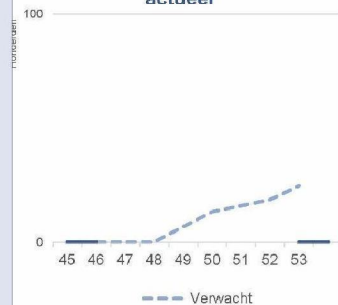

Activiteiten afgelopen week

- Aansluiting lab / medische verantwoordelijkheid
- Personeel geworven en ingewerkt

Activiteiten komende week

- Afspraak LCDK, LMMI, GGD
- Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD
- Werven en onboarden gaat door.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status L-locatie IJsselland

Locatie draait goed, we schalen op volgens afspraak. Deze week hopelijk uitwerkingen bij medische en lab verantwoordelijkheid.

✓ Onderwerp	Progres
Contact met DPG	○
Driehoek DPG – LAB - OB	○
Vergunningen en contracten	○
Materieel en inrichting	○
Personeel	○
Opleiding personeel	○
Koppeling CoronIT	○
Infrastructuur	○
Apparatuur	○
Afnamemateriaal	○
Reagentia / testen	○
PBM	○
Verkeersstromen	○
Labs op locatie	○
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
Procesbeschrijvingen	○
Capaciteitsplanning en forecast	○
Waarborging privacy	○

15. Zuid Limburg



Datum: 15 december 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie: MECC Maastricht (paviljoen)
- Openingstijden: 08.00 – 16.00 uur (bij start)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	15-12	
Antigeen	15-12	
5.1.2i Toelichting		

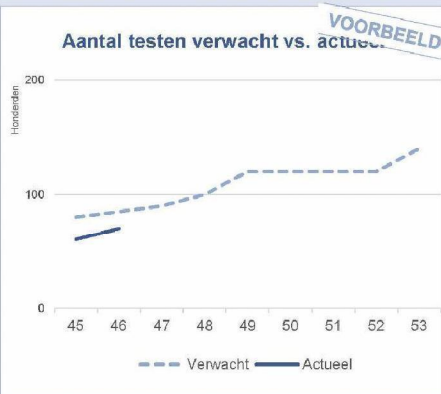

Activiteiten afgelopen week

- Opleveren bouw & inrichten locatie
- Opleiding personeel
- Bestellen materialen

Activiteiten komende week

- Bijstellen op basis van eerste ervaringen

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Zuid Limburg

Opening op 15 december. Maandag 14 december heeft laatste dryrun plaatsgevonden in aanwezigheid van enkele collega's vanuit fastlane en heeft het personeel geoefend met de testverwerking.

✓ Onderwerp	Progress
✓ Contact met DPG	●
✓ Driehoek DPG – LAB - OB	●
✓ Vergunningen en contracten	●
✓ Materieel en inrichting	●
✓ Personeel	●
✓ Opleiding personeel	●
✓ Koppeling CoronIT	●
✓ Infrastructuur	●
✓ Apparatuur	●
✓ Afnamemateriaal	●
✓ Reagentia / testen	●
✓ PBM	●
✓ Verkeersstromen	●
✓ Labs op locatie	●
✓ Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
✓ Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
✓ Waarborging privacy	●

16. Twente

Projectleider: 6.1.2e



Testlocatie

- Locatie:
- Openingstijden:

Test	vanaf	# testen / dag
------	-------	----------------

PCR

Antigeen


5.1.2i Toelichting



Status XL-locatie Twente

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding personeel	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○

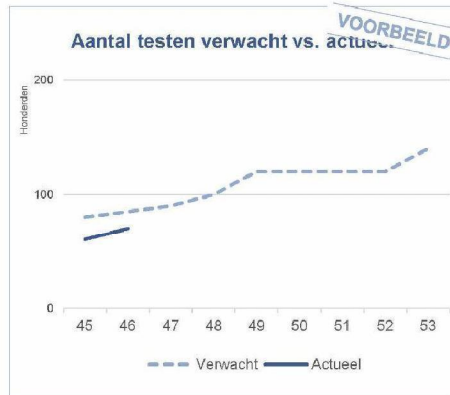

Activiteiten afgelopen week

1. Werkbezoek L-locatie Zwolle
2. Locatie: plattegrond, concept beoordeling
3. Besluit gebruik antigeentest SD Biosensor

Activiteiten komende week

1. Plattegrond locatie: afronding tbv vergunning
2. Plattegrond locatie: nadere bespreking inrichting
3. Fastlane: afspraken mbt ondersteuning
4. Nadere afstemming laboratorium / antigeenproces
5. Procesbeschrijvingen maken/aanpassen

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig
