



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Projectbijeenkomst Covidvaccinatie

30 nov. 2020

buro voor **gezonde werrelatie**
KOOIMANBOERSMA



Opening door

5.1.2e



Doelstelling van de dag

- Nieuwe structuur en mensen introduceren.
- STAVAZA helder
- Deelopdrachten + afhankelijkheden helder
- Samenwerking bevorderen (synergie ontdekken)
- Boost

Even voorstellen...



[Expertise](#) [Wie zijn wij](#) [Opdrachtgevers](#) [Partners](#) [Contact](#)



Versterken wat krachtig is, verhelderen wat troebel is, ont-wikkelen wat onzichtbaar is en ontwarren wat verstrengeld is.

TRAINING

COACHING

MEDIATION

PROCES-
BEGELEIDING

Programma

- 1) Opening en doelstelling
- 2) Het vaccinatieprogramma + STAVAZA
- 3) Programma- en vergaderstructuur

Pauze

- 4) Interview

5.1.2e


Afscheid onliners

- 5) Wie ben je, Wat doe je ?
- 6) Aan de slag in de eigen projectgroep
- 7) Conclusies, vervolg en afsluiting




2. Het vaccinatie-programma

- Vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen covid 19
- Volgens prioritering van VWS
- Snel & zorgvuldig
- Ontwikkelen lopende het programma – steile leercurve



2. Het vaccinatieprogramma (2)


- Principes én pragmatisme
- Landelijk én maatwerk
- Wendbaarheid (tot het eind)
- SAMENWERKING



Al jullie vragen, reacties naar:

5.1.5

@rivm.nl

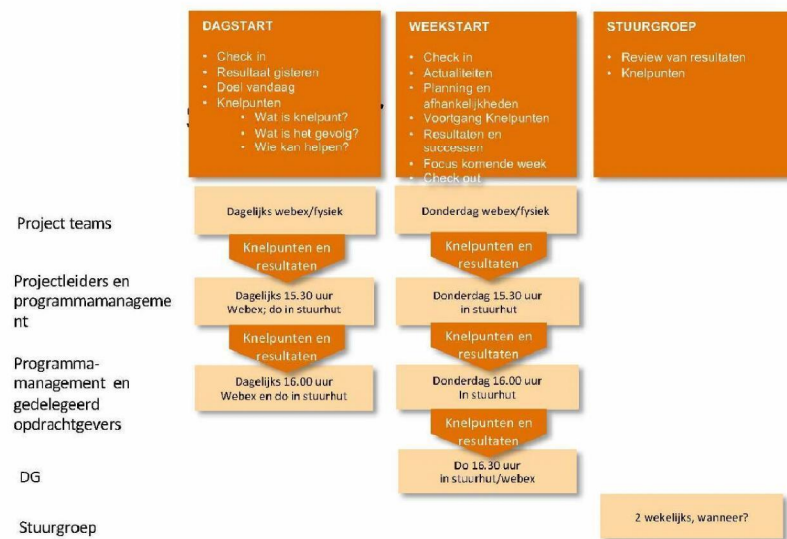

4. Interview programmamanager

1-wat-verwacht-je-vooral-van-een-programmamanager.jpg 5.120x3.040 pixels

30-11-2020 16:17

Wat verwacht je vooral van een Programmamanager?

Mentimeter



5. Wie ben je? Wat doe je?



Ga staan en..

- Naam, afdeling en hoe lang werk je bij de RIVM?
- Hoe leg je aan een kind van 6 jaar uit wat je doet?
- Wat zegt de kaart over je werkstijl?
- Hoe gedraag je je in het verkeer?



6. Aan de slag in de projectgroepen


Vraag 1:

- Wat is jullie opdracht?
- Wat is er op 15 december klaar als het klaar is?

SPECIFIEK
MEETBAAR
ACCCEPTABEL
REALISTISCH
TIJDGEBONDEN

Vraag 2:

- welke afhankelijkheden zijn er?
- Top 2/3 per project

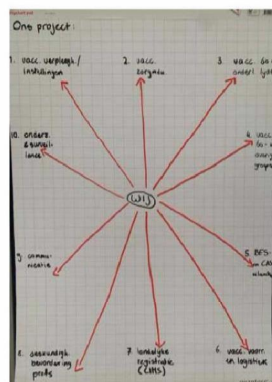


Project: intramurale verpleeghuizen & instelling
 gehandicapten **1**
 Opdracht: voorbereiding & implementatie uitvoering
 covid-19-vacc. werknemers & bewoners.

- * overzicht veld + adressen lijst ^{15 dec.}
- * lijst uitgangspunten + vastlegging convenant [?]
- * ~~geïmplementeerde~~ producten voor comm. + dk hb (richtlijn) gereed ^{15 dec.}
- * vaccins bestellen via bestelapp of alternatief [?]
- * vaccins op locatie? [?]
- * registratie van niet-gevaccineerden beslissing hoe? [?]
- * ~~best~~ besluit met zorgmedewerkers gaat vaccineren. [?]
- * tariefverrekening, hoe en aan wie, hoogte? [?]
- * besluit vacc gegevens doorgegeven, welke manier. [?]

1 Vaccinatie
 verpleeghuizen
 n&
 wooninstelling
 en voor
 verstandelijk
 gehandicapten

5.1.2e

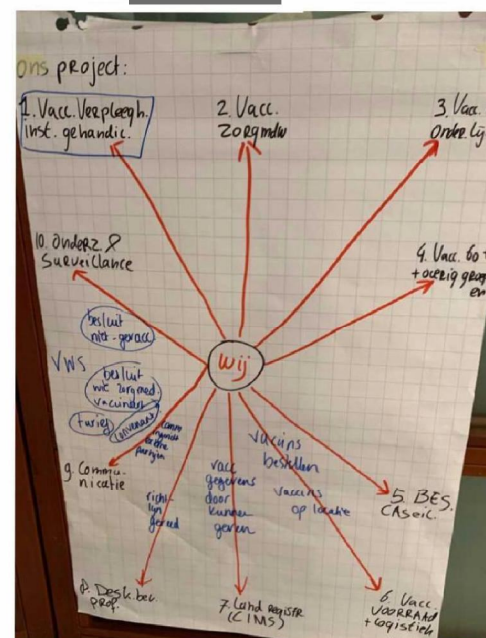

intra-muraal
Projectgroep: verpleeghuizen/ gehandicapte
bewoners + medewerkers
Onze opdracht is:
Voorbereiding & implementatie van
COVID-19-vaccinatie voor werknemers & bewo-
- ~~opstellen~~ ^{opstellen} uitgangspunten
- regie op afstemming beroepsgroepen
- Informeren van beroepsgroepen over
tijdsplanning (vaccinlog./registratie/d
- sturen juiste randvoorwaarden

1 Vaccinatie
verpleeghuizen
&
wooninstelling
en voor
verstandelijk
gehandicapten

5.1.2e

Projectgroep: 60- GGD ~~✱~~

Onze opdracht is: ...
 voorbereiding & implementatie van uitvoer van COVIDvacc. voor 60- zonder onderliggend lijden.


Klaar ^{voor} 15 dec:

→ duidelijkheid wat er van de GGD'en wordt verwacht.

- deskundighedsbeoordeling
- communicatiematerialen
- CIMS klaar voor oproepen
- omvang doelgroepen

4
 Vaccinatie 60-
 zonder
 medisch risico

5.1.2e

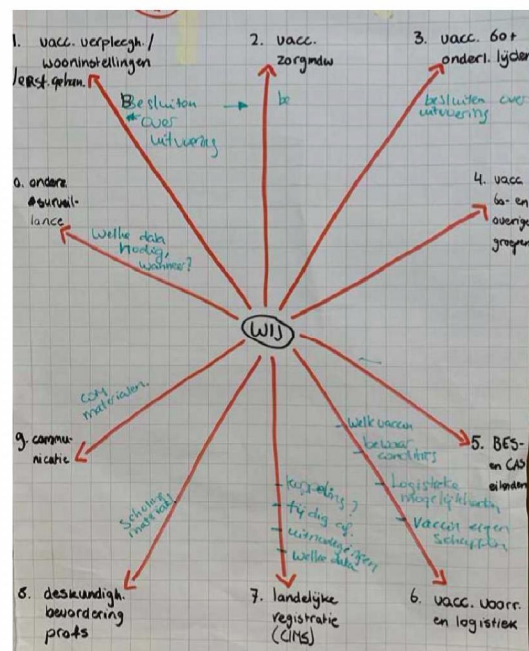


Projectgroep: desk. bevordering
onze opdracht is: Deskundigheidsbevordering voor professionals + LCI vraagbaak

- * ~~plan~~ richtlijn Covid-19-vaccinatie ^{dec} _(concept?) geaccordeerd nu 5 dec
- * consultatiepunten LCI (28 pte)
 - 24/7 bereikbaar - dec
 - inrichten vragen voor update richtlijn ^{in fases} _{realisatie}
 - inrichten casistische bespreking - jan
 - calamiteiten protocol - dec
- * Overige producten:
 - E-learning - jan _{lopended realisatie na 15 dec}
 - A & A's basis-dec
 - Nieuwsbrief - dec
 - ppt - ?

Nog te plannen: in samenwerking met uitvoerende partij comm ~~...~~ RIMM } updates + routes voor info profs

6
 Deskundigheidsbevordering professionals

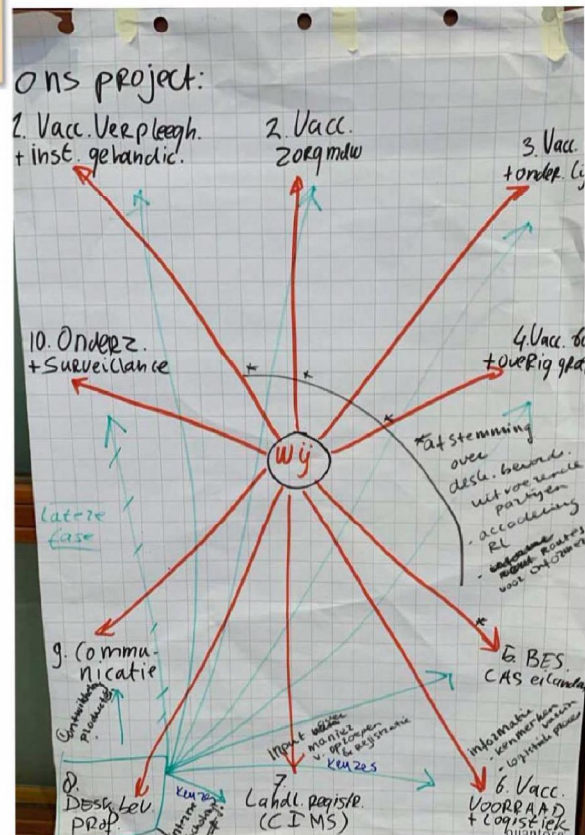

Projectgroep: Monitoring & Evaluatie


Onze opdracht is: Informatie beschikbaar maken over bereikte vaccinatiegraad & effectiviteit van vaccineren

15 DEC.

- Projectplan monitoring & evaluatie
- Concept rapportage vaccinatiegraad verpleeghuizen + vaccinatiegraad instellingen verstandelijk beperkten

7

Monitoren en evaluatie

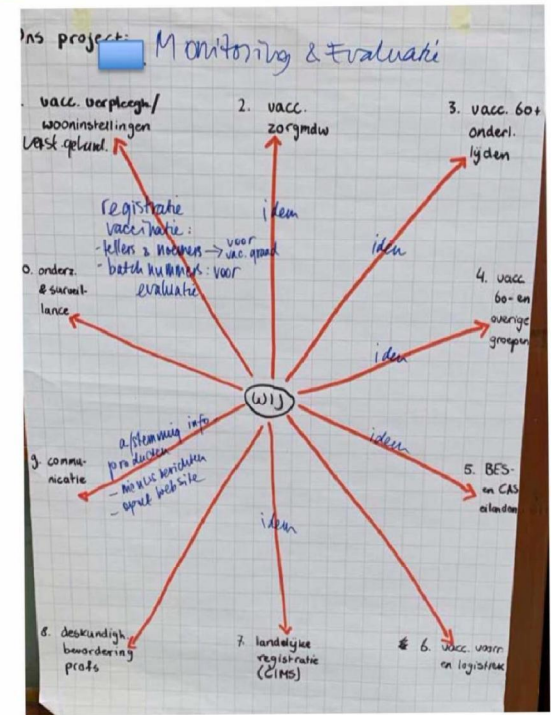


Projectgroep: Inkoop opslag Distributie
Onze opdracht is... ⑥

8/12 - Opslag vaccins conform GDP

- Monitoring beschikbaarheid
- Distributie vaccins + naar uitvoerende orgs.
- Levering via push / vraag / aanbod CUSTOMER SERVICE
- Infopunt klaar voor burgers & Profs

8
 Vaccinvoorraad en logistiek

5.1.2e

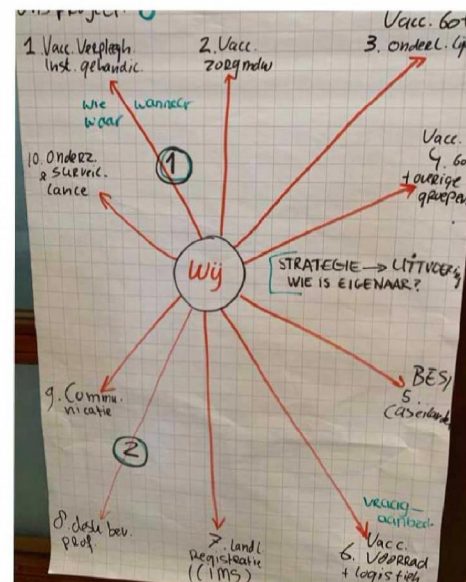

Project groep: 7

Onze opdracht is:


- * Landelijk REGISTER Bouwen/ in gebruik (Achter-
beten/ beheer)
- Beveiligde DATAVERBODINGEN (Dataopdragen)
- Zorgverleners PORTAAL
- CLIËNTPORTAAL
- RAPPORTAGE TOOLING
- INFRASTRUCTUUR
- WERKPLEKKEER
- SECTORPARK
- API'S
- RIVM TOEGANG (Digitale identiteit)
- VACCINATIEBEWIJS
- DATAWAREHOUSE

15/12/20

- CLIËNTOEFER
- OPERATIEF (OP B.R.P)
- CSV-BESTELTOEGANG
- VACCINATIESTATUS
- VERBODINGEN/REGISTER

NODIG:

- PRE-REQUISITEN
- API'S (Perman)
- DATAMODEEL
- ADMINISTRATIEF PERSOONEL (VERBODINGEN/REGISTER)
- (FARMACOLOGIE IDENTIFICATIE)

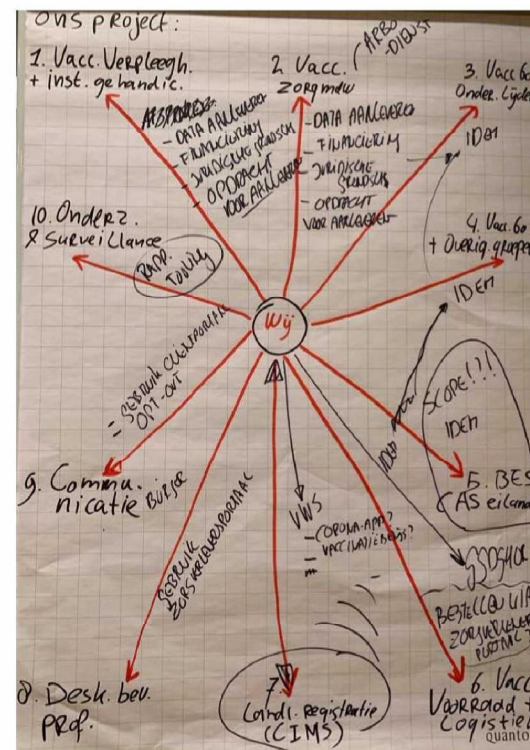

ONTBREEKT:

