

Stuurgroep update

Operatie Fastlane – VNO NCW

Samenkomst 3 initiatieven – XL locaties

VWS heeft 3 opdrachten gegeven die samenkomen in XL locaties:

1. GGD-GHOR -> Uitvoeren van de PCR roadmap, inclusief landelijke teststraten
 2. GGD Amsterdam -> realisatie testpaviljoen & pop-up labs
 3. VNO-NCW -> Creëren Antigeen test-capaciteit
-
- De 3 initiatieven zullen, in onderlinge afstemming, starten met een aantal XL locaties in te richten
 - Per locatie zal worden bekeken welk van de 3 initiatieven bij die locatie aansluiten
 - Daarnaast zullen de initiatieven ook onafhankelijk van elkaar locaties inrichten. Zoals het creëren van een fijnmazig netwerk voor afname antigeen testen
 - Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid van slim combineren van innovaties, bijvoorbeeld invoeren breathomix als voorportaal bij teststraten
-

Gezamenlijke uitgangspunten van de initiatieven

- Landelijke teststrategie is leidend voor alle partijen
- Huidig beleid – “testen met klachten” is start, totdat er genoeg capaciteit is om asymptomatisch te testen (BCO & Coronamelder)
- Alleen gevalideerde & betrouwbare testen worden ingezet
- De uitslag van de test (positief en negatief) komt in CoronIT
- In samenwerking met de betrokken regio
- De partijen werken zoveel mogelijk vanuit complementariteit
- LCT is leidend in coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief verdeling van schaarse middelen

Status update

Recente ontwikkelingen

Samenwerking GGD en VWS verder versterkt in verschillende afstemmingsmeetings met de 'trilat'

Doorontwikkeling process obv interne dry-runs en bezoek aan pilot locatie Amphia ziekenhuis Breda

Identificatie van en afstemming met zes van de zeven locaties, 'on track' om vanaf begin november live te gaan

Formatie kernteam

Samenwerking CoronIT opgestart

Defensie aangehaakt ter versterking in de opschalingsfase

Mandaat en voorwaarden tot success afgestemd

Prioriteiten vooruitkijkend komende week:

Deadline:

| | |
|---|------------|
| Concrete afstemming samenwerking GGD en aanspreekpunt aangesteld per locatie | 21 oktober |
| Duidelijkheid omtrent teststrategie VWS | 23 oktober |
| Duidelijkheid ingekochte test aantallen per merk | 23 oktober |
| Afstemming opslaan test resultaten CoronIT | 23 oktober |
| Afstemming capaciteitsplanning LCDK | 23 oktober |
| Inkoop materialen en sneltesten afgestemd met LCH en andere partijen waar nodig | 23 oktober |
| Contractvorming per locatie inregelen en aanhaken verantwoordelijke DPG | 23 oktober |
| Externe communicatie afgestemd | 23 oktober |
| Certificering geconcretiseerd ism IGJ | 23 oktober |
| Lab partner aangehaakt | 23 oktober |
| OMT advies omtrent resultaat van validatie/implementatie studie duidelijk | 23 oktober |
| Duidelijkheid kwaliteitseisen personeel | 23 oktober |
| Pilot run Utrecht antigeen opschaalttest | 26 oktober |


Overzicht testlocaties fase 1



| Locatie | Stad |
|----------------|-----------------------|
| 1 RAI | Amsterdam |
| 2 Ahoy | Rotterdam |
| 3 Airport | Rotterdam en Den Haag |
| 4 Jaarbeurs | Utrecht |
| 5 Strijp S | Eindhoven |
| 6 Martiniplaza | Groningen |
| 7 ? | Nijmegen / Arnhem |
| 8 World Forum | Den Haag |
| 9 Zuid Oost | Amsterdam |
| 10 Schiphol | Schiphol |

Deze fase 1 testlocaties zullen worden opgevolgd door uitrol van een 'fijnmazig' netwerk van kleinere locaties door het land

Mijlpalen gedurende komende vier weken

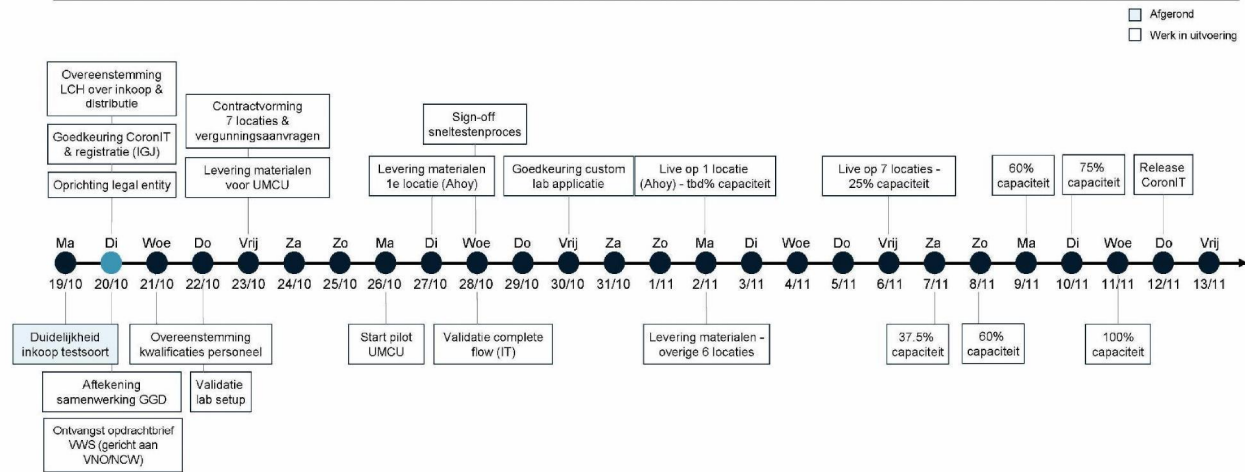

Back up

‘Trilat’ deelnemers

| Naam | Organisatie |
|---------------|--------------------|
| 5.1.2e | GGD-GHOR |
| 5.1.2e | GGD-GHOR |
| 5.1.2e | GGD-Amsterdam |
| 5.1.2e | GGD-Amsterdam |
| 5.1.2e | IG&H/WWS |
| 5.1.2e | IG&H/WWS |
| 5.1.2e 5.1.2e | VNO-NCW |
| 5.1.2e | McKinsey/VNO-NCW |
| 5.1.2e | McKinsey/VNO-NCW |
