

Ter besluitvorming : mandaat tijdens NDT 2020



Gaat het bestuur akkoord met: programmateam ((10)(2e)) en (10)(2e) worden gemachtigd om beslissingen maken over het verwisselen van plan A naar plan B, ...

...tenzij beslissingen binnen de volgende criteria vallen:

- Beslissingen met grote financiële implicaties (> (10)(1c) euro)
- Beslissingen met grote implicaties voor het netwerk en de relaties van de Stichting (dus specifieke themapartners / structurele partners waarmee de relatie door een beslissing onder druk komt te staan)

Ter info: Belangrijkste voornemens / acties ten aanzien van Corona




- We benoemen de juridische kant van de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers in de deelnemersverklaring
- Vanaf de zomerschool worden alle deelnemers geacht 1.5 meter afstand te houden. We creëren hierbij een cultuur en Bestuur, Bureau en McKinsey begeleiding geven hierin expliciet het goede voorbeeld.
- In communicatie naar deelnemers / trainers / expertdeelnemers / experts benoemen we altijd dat we ons aan de RIVM-maatregelen houden

Ter info: Strategische prioriteit digitaal/live per onderdeel van de DenkTank



Volgordelijkheid van prioriteiten voor digitaal & live

1. Groepsvorming (groepsgesprekken, kennismaking, gezamenlijke besluitvorming)
2. Subgroepjes werken samen op 1.5 meter
3. Expertsessies met themapartners
4. Sessies met expertdeelnemers/ervaringsdeskundigen
5. Sessies met experts / partners die nieuw zijn (waarmee we een nieuwe relatie willen opbouwen)
6. Trainingen van NDT
7. Grote evenementen zoals het Expertforum en de Eindpresentatie

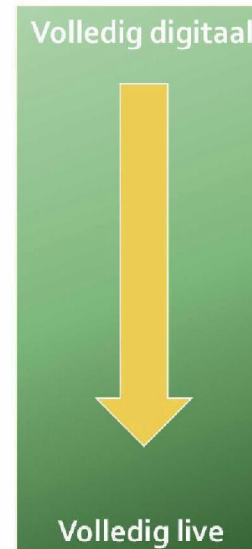

Ter info: We bereiden ons voor op scenario A, met scenario B als back-up



Scenario C : bijna volledige lock-down, VU gesloten, kerngroep NDT isoleert zichzelf van 'rest'

- 1 & 2: live : Groepsvorming (buiten op 1.5 meter) & themateams werken samen geïmproviseerd waar mogelijk (bijvoorbeeld in CASA)
- Rest moet digitaal : trainers, expertsessies etc.

Scenario B : halve lock-down / 50% kan op 1.5 meter

- 1: Groepsvorming kan live
- 2: Thema-teams kunnen samen werken op 1.5 meter
- 3. Praktijk & groepsopdrachten vinden plaats in grote groepsruimte
- (Eventementen met) externen (4, 5 & 6) vinden digitaal plaats

Scenario A : 1.5 meter samenleving

- 1 tot en met 5 (zie vorige slide) kunnen op 1.5 meter fysiek
- Eindpresentatie en Expertforum doen we bij KHMW én Compagnietheater en benutten daarbij alle ruimtes en nemen schermen in gebruik, óf houden we in fysieke vorm op 1 locatie met een grotere presentatiezaal

Scenario A++ : a miracle happens : vaccin in oktober

- Business as usual, alleen sessies waar digitaal beter is, gaan we digitaal

Ter info: Criteria voor scenariowissel



Criteria voor het wisselen van plan A naar plan B

1. Maatregelen Rijksoverheid (# personen op locatie, binnen / buiten, gezondheidschecks)
2. Additionele eigen NDT maatregelen om gezondheid extra te waarborgen
3. Laatst moment van annulering locatie(s)
4. Strategische prioriteit van in-persoon sessies

Ter info: Opzet: we gaan voor Plan A met een duidelijk Plan B indien de maatregelen strenger worden



Fase	Periode	Plan A – scenario 3 1.5m samenleving	Plan B – scenario 2 Halve lockdown	Beslismoment	Deadline voorbereidingen	Acties voor van plan A naar plan B	
1	Zomerschool Partnerraad & BBQ	17 – 28 aug	Zomerschool op 1.5 meter, externen komen fysiek langs	Denktankers, Mck in persoon op 1.5m afstand op locatie. Externen digitaal	14 mei 2020	16 juli	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen voor juiste (technische) materialen, Informeren externen
	Partnerraad	27 aug	1 locatie, in-persoon op 1.5m afstand	Digitaal (zoom)			<ul style="list-style-type: none"> Annuleren locatie Opzetten digitale infrastructuur
	BBQ	27 aug	1 locatie (buiten), in-persoon op 1.5m afstand met max 100	Annuleren			<ul style="list-style-type: none"> Annuleren locatie Communicatie naar deelnemers, alumni & TP
2	Analysefase	31 aug – 9 okt	Denktankers & Mck team op locatie F2F met externen	Groepen op 1 of meerdere locatie(s) Digitaal (zoom) met externen	BV 7 juli	14 augustus	<ul style="list-style-type: none"> Trainers informeren Digitale infrastructuur regelen Deelnemers informeren Analysewerkvormen faciliteren & voorbereiden
	Donderdagavonden		Denktankers & Mck team Programma team, alumni, TP in persoon	Denktankers & Mck team in persoon Programma team, alumni, TP via zoom			<ul style="list-style-type: none"> Annuleren locatie donderdagavonden. Communiceren wijziging set-up naar TP, alumni, Bestuur Regelen infrastructuur digitale donderdagavonden
3	Expertforum	8 okt	1 locatie met meerdere zalen met schermen	Zoom sessie / streaming sessie met interactieve break-outs	BV 7 juli of BV 18 augustus	11 september	<ul style="list-style-type: none"> Annuleren locatie Communicatie naar deelnemers Locaties voor hybride EP, per themateam Studio's voor streamen

Ter info: Opzet: we gaan voor Plan A met een duidelijk Plan B indien de maatregelen strenger worden



Fase	Periode	Plan A – scenario 3 1,5m samenleving	Plan B – scenario 2 Halve lockdown	Beslismoment	Deadline voorbereidingen	Acties voor van plan A naar plan B
Herfstschool & Brainstormweek	12 – 23 okt	Groepssessies gaan door op 1,5 meter. Co-creatie met TP & brainstormsessie gaan ook door live .	Groepssessies gaan door op 1,5 meter. Co-creatie met TP is digitaal Brainstormen in teams ook digitaal.	BV 8 sept	25 september	<ul style="list-style-type: none"> • Informeren TP over wijziging. • Zoominfrastructuur opzetten, • Ruimtes afzeggen voor co-creatie. • Voorbereiden werkvormen digitale brainstorm
Oplossingsfase I	25 okt – 13 nov	Groepssessies live PitchPerfect live Oplossingsrichtingsteams (beleid, campagne, concreet) op 1,5 meter laten meeten .	Groepssessies digitaal PitchPerfect digitaal Oplossingsrichtingsteams (beleid, campagne, concreet) gaan digitaal	BV 8 sept	2 oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Groepsruimte annuleren (en geld hiervoor terugvragen) • Werkvormen voor Digitale PitchPerfect organiseren (annuleren locatie, informeren bezoekers) • Infrastructuur digitaal werken & brainstormen.
Oplossingsfase II	15 nov – 11 dec	Oplossingsteams : werken live op de VU met z'n z'en werken Trainingen live	Oplossingsteams : kunnen ook buiten de VU met z'n z'en werken Trainingen digitaal	27 oktober	5 november	<ul style="list-style-type: none"> • Informeren deelnemers • Contact met VU • Contact met trainers over digitaal / offline
Eindpresentatie	(13, 14) 15 dec	Uitspreiding publiek in CT over kleine zaal, foyer en zuilenzaal met schermen	In hybride-vorm (NDT'ers fysiek samen), presentatie wordt gestreamd.	BV 18 aug * Compagnietheater	...	<ul style="list-style-type: none"> • Afzeggen compagnietheater & kiezen van een locatie die EP kan streamen • Regelen van een professioneel streamingsbedrijf • Informeren van bezoekers
Evaluatie	16 - 18 dec	Live in persoon op de VU	Digitale evaluatie	27 oktober	27 november	<ul style="list-style-type: none"> • Informeren deelnemers • Afzeggen live locaties

Ter info: Next steps en tijdslijn (Work In Progress)



Fase	Periode	Beslismoment	Deadline voorbereiding en	Uit te zoeken	Wie?
1 Zomerschool, Partnerraad & BBQ	17 – 28 aug 27 aug	14 mei 2020	16 juli	Interactieve werkvormen uitwerken	(10)(2e)
2 Analysefase & donderdagavonden	31 aug – 9 okt	BV 7 juli	14 augustus	Groepsruimtes, streaming DA, werkvormen	
3 Expertforum	8 okt	BV 7 juli of BV 18 augustus	11 september	Hybride-opties (streaming, locaties), KHMW schermen inzetten, evt alternatieve locatie	
4 Herfst - & brainstormweek	12 – 23 okt	BV 8 sept	25 september	Locaties, werkvormen	
5 Oplossingsfase I & donderdagavonden incl. Pitch Perfect	25 okt – 13 nov	BV 8 sept	2 oktober	Manieren om de "straat op te gaan" – agile testing, werkvormen, locaties voor teams 10+	
6 Oplossingsfase II & donderdagavonden	15 nov – 11 dec	27 oktober	5 november	Dialogoog met deelnemers: mogelijkheden thuiswerken	
7 Eindpresentatie	(13, 14) 15 dec	BV 18 aug * Compagnietheater	...	Locaties, streaming, gebruik alle zalen met schermen	
8 Evaluatie	16 - 18 dec	27 oktober	27 november	Locatie	
